SunuLink CONSULTING



Événementiel

& activation de marque

Concevoir des événements mémorables, réussir ses lancements et créer des expériences de marque à fort impact

GUIDE PRATIQUE ÉDITION 2026-2027 J-90 · JOUR J · J+30

Par SunuLink Consulting

Cabinet de conseil stratégique & agence de communication 360°

Le lien qui transforme vos ambitions en impact.

SOMMAIRE

Six parties, vingt-neuf chapitres

I Comprendre et cadrer

01 L'événementiel comme levier stratégique 004
02 Comprendre l'événementiel et l'activation de marque 006
03 Définir les objectifs d'un événement 008
04 Connaître son public et concevoir une expérience pertinente 010

II Concevoir l'événement

05 Construire un concept événementiel différenciant 013
06 Développer une stratégie événementielle 015
07 Choisir le format et le lieu adaptés 017

III Organiser et préparer l'expérience

08 Élaborer le budget et maîtriser les coûts 020
09 Planifier et piloter l'organisation 022
10 Créer une identité événementielle cohérente 024
11 Concevoir le parcours et l'expérience des participants 026

IV Activer : lancements, terrain, corporate, hybride

12 Réussir un lancement de produit ou de service 029
13 Concevoir une activation de marque sur le terrain 031
14 Organiser un événement corporate 034
15 Événementiel digital et formats hybrides 036

V Communiquer et opérer

16 Communication avant, pendant et après l'événement 039
17 Relations presse, influence et partenariats 041
18 Logistique, prestataires et coordination opérationnelle 043
19 Accueil, protocole et expérience des invités 045
20 Événementiel responsable et inclusion 047
21 Gestion des risques et communication de crise 049


VI Mesurer et passer à l'action

22 Mesurer les résultats et le retour sur investissement 052
23 Exploiter les contenus et prolonger l'expérience 054
24 Intelligence artificielle et innovation événementielle 056
25 Les erreurs les plus fréquentes 058
26 La méthode SunuLink pour piloter un projet événementiel 060
27 Plan d'action sur 90 jours 062
28 Modèles, fiches pratiques et check-lists 065
29 Faire de chaque événement un levier d'impact 070
★ À propos de SunuLink Consulting 072

PARTIE I

01

ACTE 01 SUR 06

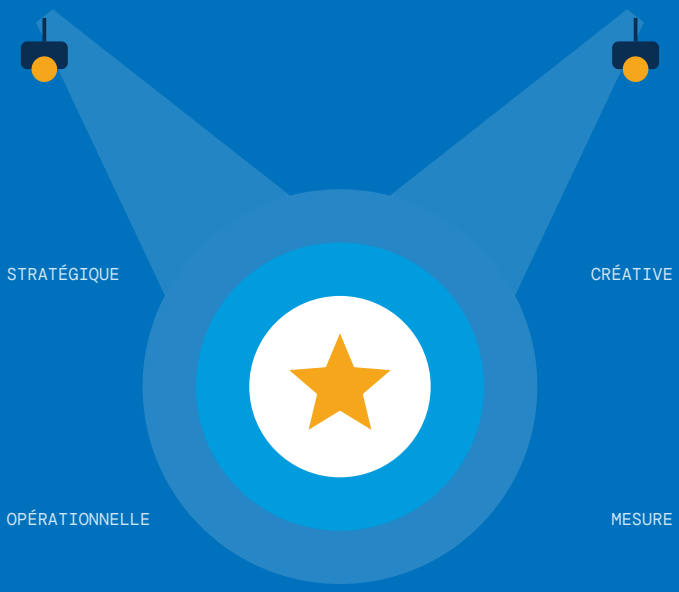

Comprendre et cadrer

01 L'événementiel comme levier stratégique
02 Comprendre l'événementiel et l'activation de marque
03 Définir les objectifs d'un événement
04 Connaître son public et concevoir une expérience pertinente

CHAPITRES 01 À 04 SUR 29

BILLET N°

01

ACCÈS · CH. 01/29

PARTIE I — COMPRENDRE ET CADRER

L'événementiel comme levier stratégique

Un événement est bien plus qu'un rassemblement : c'est une rencontre qui transmet un message et fait vivre une marque.

Un événement est bien plus qu'un rassemblement de personnes dans un lieu donné. Il représente une occasion de créer une rencontre, de transmettre un message, de présenter une offre, de renforcer une relation ou de faire vivre une marque de manière concrète.

Dans un environnement où les publics sont exposés à de nombreuses sollicitations numériques, l'expérience physique apporte une dimension particulière à la communication. Elle permet de découvrir un produit, d'échanger directement avec une équipe, de rencontrer des experts, de participer à une activité ou de partager un moment collectif.

> **Organiser un événement ne garantit pas son efficacité.**

Un lancement peut réunir de nombreux invités sans générer de prospects qualifiés. Une activation peut attirer une foule sans produire de mémorisation durable. Une conférence peut être bien organisée sans transmettre clairement le message attendu.

La réussite dépend de la cohérence entre l'objectif, le public, le concept, l'expérience proposée, l'organisation et les résultats mesurés. C'est pourquoi l'événementiel doit être considéré comme un outil stratégique, et non comme une simple opération logistique.

Pourquoi investir dans l'événementiel ?

Un dispositif événementiel bien conçu peut contribuer à :

- Notoriété
- Présenter un produit ou un service
- Relation directe avec les clients
- Confiance
- Prospects et opportunités
- Mobiliser équipes et partenaires
- Valoriser une expertise
- Contenus pour le digital
- Engagement d'une communauté
- Accompagner une transformation

À RETENIR

L'événementiel est particulièrement intéressant lorsqu'il complète les autres leviers : une campagne digitale prépare la rencontre, l'événement donne vie au message et les contenus produits prolongent son impact.

Les objectifs de ce guide

À la fin de cette lecture, vous serez capable de :

01 Comprendre les principaux formats événementiels.

02 Définir des objectifs précis et mesurables.

03 Concevoir un concept cohérent avec une marque.

04 Identifier les publics et organiser leur parcours.

05 Construire un budget et un calendrier.

06 Coordonner les prestataires et les équipes.

07 Organiser un lancement ou une activation terrain.

08 Communiquer avant, pendant et après l'événement.

09 Anticiper les risques.

10 Évaluer les résultats et le retour sur investissement.

EXEMPLE

À qui s'adresse ce guide ?

Aux dirigeants, responsables marketing, communicants, chefs de projet, entrepreneurs, agences, organisateurs d'événements et professionnels de l'activation de marque.

À RETENIR

CHAPITRE 01

Un événement est un outil stratégique, pas une simple opération logistique.

BILLET N°

02

ACCÈS · CH. 02/29

PARTIE I — COMPRENDRE ET CADRER

Comprendre l'événementiel et l'activation de marque

Formats, activations, différences et dimensions : le vocabulaire commun avant de concevoir.

2.1 Qu'est-ce que l'événementiel ?

L'événementiel désigne la conception, l'organisation et la réalisation d'événements destinés à réunir un public autour d'un objectif. Il comprend notamment :

01 Conférences et séminaires

02 Lancements de produits

03 Inaugurations

04 Salons professionnels

05 Journées portes ouvertes

06 Cérémonies institutionnelles

07 Conventions d'entreprise

08 Événements de réseautage

09 Festivals et manifestations culturelles

10 Événements de fidélisation

11 Événements sportifs ou associatifs

12 Événements digitaux et hybrides

Chaque format répond à des objectifs et à des contraintes spécifiques.

2.2 Qu'est-ce que l'activation de marque ?

L'activation de marque consiste à concevoir une expérience ou une interaction destinée à rendre une marque plus tangible et à encourager une réaction de son public : une découverte, un essai, une participation, une inscription, une recommandation ou un achat.

Les activations peuvent se dérouler dans des lieux commerciaux, des espaces publics autorisés, des campus, des salons, des événements partenaires ou des environnements numériques. Par exemple :

- Démonstration d'un produit
- Échantillonnage
- Animation commerciale
- Jeu participatif
- Installation expérientielle
- Démonstration interactive
- Tournée promotionnelle
- Présence sur un salon
- Réalité augmentée
- Rencontre avec des ambassadeurs

2.3 Événementiel et activation : quelle différence ?

ÉVÉNEMENTIEL	ACTIVATION DE MARQUE
Peut réunir plusieurs publics autour d'un programme	Vise généralement une interaction ciblée avec la marque
Peut avoir une dimension institutionnelle, commerciale ou relationnelle	Cherche à provoquer une réaction ou un engagement précis
S'appuie souvent sur un lieu, une date et un déroulé	Peut être ponctuelle, mobile, répétée ou intégrée à un événement
Peut privilégier l'information, la rencontre ou la célébration	Met l'accent sur l'expérience, l'essai et l'interaction

Les deux disciplines sont complémentaires. Un lancement peut intégrer une activation permettant aux invités de tester le produit ; une tournée terrain peut être accompagnée d'un événement de lancement.

2.4 Les quatre dimensions d'un événement réussi

01 — Stratégique
Pourquoi l'événement existe et quels résultats sont attendus.

02 — Créative
Quelle idée rend l'expérience pertinente et distinctive.

03 — Opérationnelle
Comment l'événement sera organisé et réalisé.

04 — Mesure
Comment vérifier les résultats et tirer des enseignements.

★ À RETENIR

Une faiblesse importante dans l'une des quatre dimensions peut compromettre l'ensemble du projet.

BILLET N°

03

ACCÈS · CH. 03/29

PARTIE I — COMPRENDRE ET CADRER

Définir les objectifs d'un événement

La première question n'est pas « Quel événement organiser ? », mais « Quel besoin devons-nous satisfaire ? ».

Avant de choisir un lieu ou de contacter des prestataires, il faut déterminer ce que l'événement doit accomplir.

3.1 Les principaux objectifs

01

Notoriété

Faire connaître une marque, une offre ou une initiative à un public donné. **Indicateurs :** portée, participants touchés, couverture médiatique, mentions et visibilité sur les réseaux sociaux.

02

Acquisition commerciale

Identifier de nouveaux prospects et créer des opportunités de vente. **Indicateurs :** prospects collectés avec un consentement approprié, rendez-vous, demandes de devis, opportunités qualifiées.

01

Lancement

Présenter un nouveau produit, un service, une marque ou une nouvelle implantation. **Indicateurs :** participation de la cible, demandes d'information, essais, couverture médiatique, conversions ultérieures.

02

Fidélisation

Renforcer les relations avec les clients, les partenaires ou les communautés. **Indicateurs :** taux de participation des invités ciblés, satisfaction, intentions de renouvellement, interactions après l'événement.

01

Communication interne

Mobiliser les collaborateurs, présenter une orientation ou accompagner un changement. **Indicateurs :** participation, compréhension du message, satisfaction et retours des équipes.

02

Sensibilisation

Faire comprendre un enjeu et encourager un comportement. **Indicateurs :** participation aux activités, compréhension du message, engagement et actions réalisées ensuite.

3.2 Formuler un objectif SMART

Un objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et limité dans le temps.

TROP VAGUE

« Organiser un événement pour faire connaître notre nouvelle offre. »

→

PLUS PRÉCIS

« Organiser une rencontre de présentation destinée à des décideurs de PME, obtenir 80 participants qualifiés et générer 20 demandes de rendez-vous dans les quatre semaines suivant l'événement. »

★ À SAVOIR

Ces chiffres sont illustratifs. Les objectifs réels s'établissent à partir de la cible, du budget, de la capacité d'accueil et des performances historiques lorsqu'elles existent.

3.3 Distinguer les résultats immédiats et différés

OBSERVABLES PENDANT L'ÉVÉNEMENT

Présence des participants · démonstrations réalisées · contacts recueillis · questions posées · interactions avec les équipes.

+

OBSERVABLES AVEC UN SUIVI

Conversion des prospects · signature de contrats · réachat · recommandation · évolution de la perception de la marque.

★ À RETENIR

CHAPITRE 03

Un événement peut être bien exécuté sans que tous ses bénéfices commerciaux apparaissent immédiatement.

BILLET N°

04

ACCÈS · CH. 04/29

PARTIE I — COMPRENDRE ET CADRER

Connaître son public et concevoir une expérience pertinente

Un événement réussi apporte une valeur réelle aux personnes auxquelles il s'adresse.

Un événement n'est pas réussi simplement parce que les organisateurs apprécient le concept. Il doit apporter une valeur réelle aux personnes auxquelles il s'adresse.

4.1 Identifier les publics

- Clients existants
- Prospects
- Distributeurs
- Partenaires
- Journalistes
- Influenceurs
- Investisseurs
- Collaborateurs
- Responsables institutionnels
- Communautés locales
- Utilisateurs finaux

Ces groupes n'ont pas les mêmes attentes. Un dirigeant peut rechercher des informations stratégiques, un client vouloir tester une solution, un journaliste avoir besoin de données vérifiées, un partenaire privilégier les opportunités de collaboration.

4.2 Construire des profils de participants

Pour chaque public prioritaire, préciser :

01 Son rôle

02 Ses besoins

03 Ses motivations

04 Ses contraintes de déplacement

05 Ses disponibilités

06 Ses attentes

07 Les objections qu'il pourrait avoir

08 Les actions que l'événement devrait faciliter

Cette analyse aide à choisir le lieu, la durée, le programme, les services et le niveau de formalité.

4.3 Concevoir une proposition de valeur événementielle

Pourquoi une personne devrait-elle consacrer du temps à cet événement ?

01 Découvrir une nouveauté

02 Apprendre une méthode

03 Rencontrer des experts

04 Échanger avec d'autres professionnels

05 Tester une solution

06 Accéder à une démonstration

07 Participer à une activité exclusive

08 Obtenir des réponses à un problème concret

L'invitation doit expliquer clairement cette valeur.

4.4 Tenir compte du contexte local

Au Sénégal et dans d'autres marchés africains, la planification tient compte des réalités propres au public et au lieu : circulation, accessibilité, conditions météorologiques, calendrier professionnel, habitudes de déplacement, langues utilisées et disponibilité des prestataires. Il faut également vérifier les dates importantes, les contraintes locales, les autorisations nécessaires et les conditions pratiques de participation.


À RETENIR CHAPITRE 04

Le contexte local n'est pas un détail : il influence directement la présence, le confort et l'expérience des participants.

PARTIE II

02

ACTE 02 SUR 06

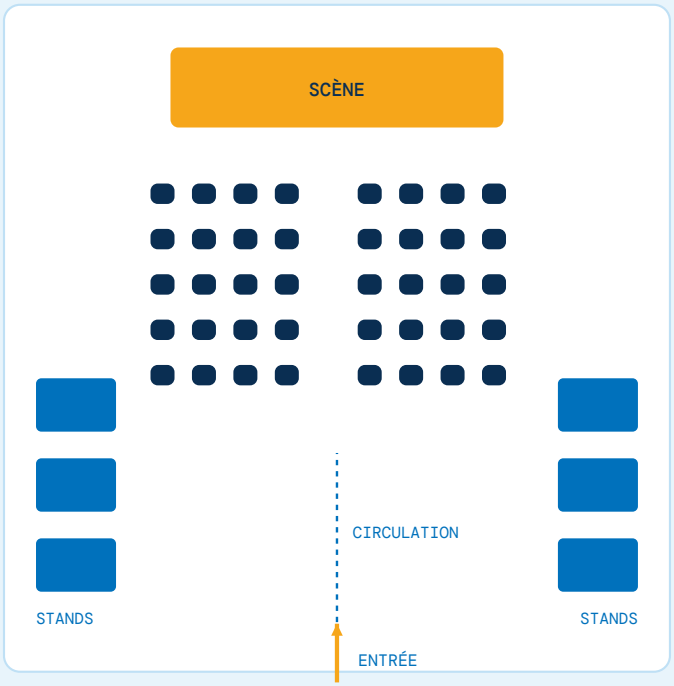

Concevoir l'événement

05 Construire un concept événementiel différenciant
06 Développer une stratégie événementielle
07 Choisir le format et le lieu adaptés

CHAPITRES 05 À 07 SUR 29

BILLET N°

05

ACCÈS · CH. 05/29

PARTIE II — CONCEVOIR L'ÉVÉNEMENT

Construire un concept événementiel différenciant

Transformer un objectif en idée directrice, visible dans le programme, le décor, les activités et les messages.

Le concept donne une identité à l'événement. Il transforme un objectif en idée directrice qui se retrouve dans le programme, le décor, les activités, les messages et l'expérience.

5.1 Les éléments d'un concept solide

01 Le sujet central

02 Le public visé

03 La promesse

04 L'idée créative

05 Le ton

06 Le format

07 Les interactions proposées

08 Les éléments visuels

09 Le résultat attendu

Un bon concept n'a pas besoin d'être compliqué. Il doit être compréhensible, pertinent, distinctif et réalisable.

5.2 Partir d'un enjeu réel

SUJET GÉNÉRAL

Le lancement d'un nouveau service numérique.

→

CONCEPT PLUS PRÉCIS

Une expérience autour du passage d'un processus manuel à un processus simplifié.

Le programme pourrait alors intégrer :

01 **Une démonstration en direct**

02 **Une mise en situation**

03 **Des échanges avec les experts**

04 **Un espace de questions**

05 **Les prochaines étapes**

Le concept se traduit dans l'expérience, au lieu de rester une simple formule publicitaire.

5.3 Évaluer la faisabilité

Avant de retenir une idée, vérifier :

- Son adéquation avec les objectifs.
- Sa pertinence pour le public.
- Son coût.
- Ses besoins techniques.
- Le temps de préparation.
- Les contraintes du lieu.
- Les risques.
- Les possibilités de mesure.

★ À SAVOIR

Une idée spectaculaire mais irréalisable dans les délais ou le budget n'est pas une bonne idée.

5.4 Créer une expérience distinctive

La différenciation peut venir :

- De la qualité de l'accueil
- De la pertinence des intervenants
- ★ D'une démonstration concrète
- D'une activité participative
- D'une scénographie bien pensée
- ★ De l'essai d'un produit
- D'une rencontre utile
- D'un contenu exclusif
- ★ D'une attention portée aux participants

★ À RETENIR CHAPITRE 05

La différenciation ne dépend pas uniquement du décor ou du montant investi.

BILLET N°

06

ACCÈS · CH. 06/29

PARTIE II — CONCEVOIR L'ÉVÉNEMENT

Développer une stratégie événementielle

Positionnement, canaux et architecture de messages : l'événement au service d'une stratégie plus large.

L'événement s'inscrit dans une stratégie de communication plus large. Il faut déterminer comment il contribue au positionnement de la marque, à sa relation avec ses publics et à ses objectifs commerciaux ou institutionnels.

6.1 Définir le positionnement

Le positionnement événementiel répond à plusieurs questions :

01 Quelle image voulons-nous renforcer ?

02 Quelle perception souhaitons-nous faire évoluer ?

03 Quel message doit rester après l'événement ?

04 Quelle différence voulons-nous démontrer ?

05 Quels éléments prouvent notre crédibilité ?

6.2 Articuler l'événement avec les autres canaux

AVANT — Préparer	PENDANT — Faire vivre	APRÈS — Prolonger
Communication digitale, invitations, relations presse, partenariats et inscriptions.	Accueil, animation, prises de parole, démonstrations, contenus en direct et interactions.	Remerciements, compte rendu, photos, vidéos, suivi commercial et évaluation.

Chaque canal joue un rôle complémentaire.

6.3 Construire une architecture de messages

Définir :

01 **Un message principal**

02 **Deux ou trois messages secondaires**

03 **Les preuves associées**

04 **Les éléments de langage des intervenants**

05 **Les appels à l'action**

06 **Les questions sensibles et leurs réponses validées**

★ À RETENIR CHAPITRE 06

Une architecture de messages évite les contradictions entre les discours, les supports et les publications.

NOTES DE L'ORGANISATEUR *Idées, contacts, points à appliquer*

BILLET N°

07

ACCÈS · CH. 07/29

PARTIE II — CONCEVOIR L'ÉVÉNEMENT

Choisir le format et le lieu adaptés

Le lieu et le format découlent des objectifs et des besoins des participants, jamais l'inverse.

Le lieu et le format doivent découler des objectifs et des besoins des participants.

7.1 Les formats courants

FORMAT	OBJECTIF PRINCIPAL
Conférence	Informer et partager une expertise
Séminaire	Approfondir un sujet et favoriser les échanges
Lancement	Présenter une offre ou une nouveauté
Salon	Rencontrer plusieurs publics et présenter une offre
Journée portes ouvertes	Faire découvrir une organisation
Atelier	Apprendre par la pratique
Roadshow	Déployer une présence dans plusieurs lieux
Activation commerciale	Favoriser l'essai, l'interaction ou l'achat
Gala ou cérémonie	Célébrer, valoriser ou remercier
Webinaire	Transmettre des informations à distance
Événement hybride	Associer une audience sur place et à distance

7.2 Choisir le lieu


Évaluer :

- La capacité
- L'accessibilité
- La localisation
- Stationnement ou transport
- Les installations techniques
- La qualité acoustique
- Ventilation et confort
- Les sanitaires
- La sécurité
- Les espaces de circulation
- La restauration
- Les conditions d'annulation
- Montage et démontage


> PRINCIPE
>
> Visitez le lieu ou réalisez une vérification technique avant de confirmer définitivement le choix.

7.3 Évaluer la capacité réelle

CAPACITÉ ANNONCÉE

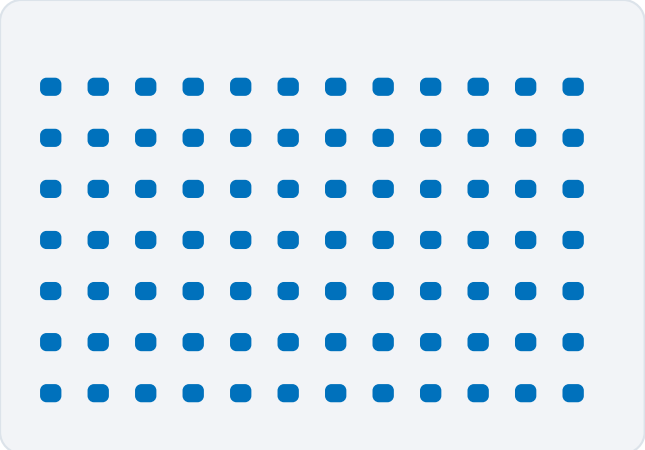

CAPACITÉ UTILE

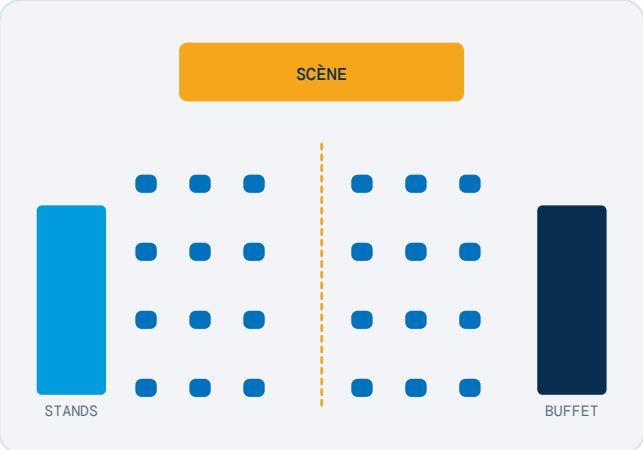

Une configuration avec scène, espaces de circulation, stands et restauration réduit le nombre de personnes pouvant être accueillies confortablement. Le plan d'implantation tient compte du parcours des participants, des issues, des accès techniques et des obligations de sécurité.


À RETENIR CHAPITRE 07

La capacité annoncée d'un lieu ne correspond pas toujours à la capacité utile de l'événement.

PARTIE III

03

ACTE 03 SUR 06



PRÉPARER

SUIVRE

Organiser et préparer l'expérience

08 Élaborer le budget et maîtriser les coûts
09 Planifier et piloter l'organisation
10 Créer une identité événementielle cohérente
11 Concevoir le parcours et l'expérience des participants

CHAPITRES 08 À 11 SUR 29

BILLET N°

08

ACCÈS · CH. 08/29

PARTIE III — ORGANISER ET PRÉPARER L'EXPÉRIENCE

Élaborer le budget et maîtriser les coûts


Le budget transforme une idée en projet réalisable. Il se construit avant les engagements majeurs.

Le budget transforme une idée en projet réalisable. Il se construit avant les engagements majeurs et se met à jour à mesure que les choix se précisent.

8.1 Les principaux postes budgétaires

POSTE	EXEMPLES
Conception	Stratégie, concept, coordination créative
Lieu	Location, espaces annexes, frais associés
Scénographie	Décor, mobilier, signalétique, habillage
Technique	Sonorisation, éclairage, écrans, captation
Production	Coordination, montage, démontage
Ressources humaines	Accueil, animation, sécurité, techniciens
Restauration	Boissons, repas, pauses
Communication	Création graphique, impression, publicité
Transport	Déplacements, livraison, logistique
Intervenants	Honoraires, hébergement, déplacements
Audiovisuel	Photographie, vidéo, diffusion en direct
Activation	Matériel de démonstration, échantillons, animateurs
Autorisations	Frais applicables selon le lieu et le dispositif
Réserve	Imprévus et ajustements

8.2 Distinguer les coûts fixes et variables

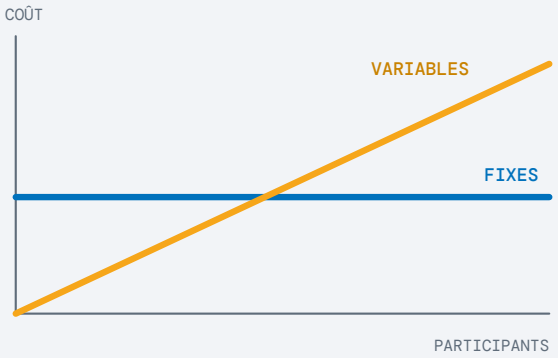

Coûts fixes

Évoluent peu avec le nombre de participants, dans une certaine limite : location du lieu, scénographie, certains équipements.

Coûts variables

Augmentent avec le nombre de participants : repas, badges, kits remis aux invités.

Cette distinction aide à comprendre l'effet d'une augmentation ou d'une baisse du nombre d'inscrits.

8.3 Prévoir une réserve

Un événement peut subir des changements de prix, des besoins techniques supplémentaires ou des contraintes imprévues. La réserve se définit en fonction du niveau de risque, de la complexité et de la maturité du projet.

★ À SAVOIR

La réserve ne doit pas servir à dissimuler des dépenses mal évaluées.

8.4 Comparer les devis

Ne comparez pas uniquement le prix total. Vérifiez :

- ☐ Le détail des prestations.
- ☐ Le nombre de personnes mobilisées.
- ☐ Les horaires couverts.
- ☐ Les frais de transport.
- ☐ Le matériel inclus.
- ☐ Les conditions de paiement.
- ☐ Les délais de livraison.
- ☐ Les modalités de modification.
- ☐ Les exclusions.
- ☐ Les conditions d'annulation.
- ☐ Les responsabilités en cas de problème.

★ À RETENIR CHAPITRE 08

Un devis moins cher peut coûter davantage si son périmètre est incomplet.

BILLET N°

09

ACCÈS · CH. 09/29

PARTIE III — ORGANISER ET PRÉPARER L'EXPÉRIENCE

Planifier et piloter l'organisation

Des décisions stratégiques aux tâches concrètes, attribuées à des responsables et assorties de délais.

La planification transforme les décisions stratégiques en tâches concrètes, attribuées à des responsables et assorties de délais.

9.1 Construire un rétroplanning

Le rétroplanning part de la date de l'événement et remonte le temps pour identifier les étapes nécessaires. Pour un événement de taille moyenne, un calendrier indicatif pourrait prévoir :

J-90 à J-60	Objectifs, concept, budget, lieu et partenaires
J-60 à J-45	Prestataires, identité visuelle, programme
J-45 à J-30	Invitations, inscriptions, communication
J-30 à J-15	Confirmations, logistique, production des supports
J-15 à J-7	Tests techniques, briefing des équipes
J-7 à J-1	Vérifications finales, listes, montage préparatoire
Jour J	**Exécution, coordination et gestion des incidents**
J+1 à J+7	Remerciements, bilan initial et suivi des contacts
J+7 à J+30	Suivi commercial, analyse et rapport final

Ce calendrier s'adapte à la taille de l'événement : un lancement national ou un grand salon peut exiger une préparation beaucoup plus longue.

9.2 Définir les responsabilités

Chaque tâche importante doit avoir un responsable clairement identifié. Une organisation peut comprendre :

- Chef de projet
- Responsable logistique
- Responsable technique
- Responsable communication
- Responsable accueil
- Responsable des intervenants
- Responsable sécurité
- Responsable du suivi commercial
- Responsable du reporting

Dans une petite équipe, une même personne peut assumer plusieurs fonctions. Les responsabilités doivent néanmoins rester explicites.

9.3 Mettre en place un outil de suivi

TÂCHE	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	BUDGET PRÉVU	STATUT	RISQUE OU COMMENTAIRE
Validation du lieu					
Confirmation des prestataires					
Envoi des invitations					
Production des supports					
Tests techniques					
Rapport post-événement					

★ À RETENIR — CHAPITRE 09

Tableur ou plateforme de gestion de projet : l'essentiel est que les informations soient à jour et accessibles aux personnes concernées.

BILLET N°

10

ACCÈS · CH. 10/29

PARTIE III — ORGANISER ET PRÉPARER L'EXPÉRIENCE

Créer une identité événementielle cohérente

Traduire le concept en repères visuels qui accompagnent les participants du premier au dernier contact.

L'identité événementielle traduit le concept en éléments visuels et en repères qui accompagnent les participants. Elle contribue à la reconnaissance de l'événement et à la cohérence de tous les supports.

10.1 Les supports à prévoir

01 Logo ou signature

02 Affiche

03 Invitation numérique

04 Programme

05 Badge

06 Signalétique

07 Fond de scène

08 Écrans de présentation

09 Habillage des stands

10 Supports de démonstration

11 Visuels pour les réseaux

12 Dossier de presse

13 Supports de remerciement

Tous ces éléments reprennent les mêmes principes de typographie, de couleur, de hiérarchie et de ton.

10.2 Éviter la surcharge visuelle

Un espace événementiel ne doit pas devenir une accumulation de logos et de messages. La hiérarchie doit permettre d'identifier rapidement :



01 Le nom ou le sujet de l'événement

02 L'organisateur

03 Le message principal

04 Les informations pratiques

05 Les partenaires, selon les accords établis

La visibilité des partenaires respecte les engagements contractuels et reste compatible avec la lisibilité globale.

10.3 Prolonger l'identité dans l'expérience

L'identité ne se limite pas aux supports imprimés. Elle se retrouve dans :

- Le ton de l'accueil
- Les animations
- Les présentations
- Les messages du maître de cérémonie
- Les démonstrations
- Les contenus numériques
- Les objets remis aux participants

★ À RETENIR CHAPITRE 10

L'objectif est de construire une expérience cohérente, plutôt que de juxtaposer des éléments décoratifs.

BILLET N°

11

ACCÈS · CH. 11/29

PARTIE III — ORGANISER ET PRÉPARER L'EXPÉRIENCE

Concevoir le parcours et l'expérience des participants

L'expérience commence avant l'arrivée sur le lieu et continue après le départ.

11.1 Cartographier le parcours

AVANT L'ÉVÉNEMENT

01 Découverte
02 Invitation
03 Inscription
04 Confirmation
05 Arrivée

PENDANT ET APRÈS

06 Accueil
07 Participation
08 Interaction
09 Départ
10 Suivi

À chaque étape, il faut identifier les attentes et les risques de friction. Par exemple :

01 Une invitation peu claire
peut limiter les inscriptions.

02 Une confirmation incomplète
peut créer des questions pratiques.

03 Une signalétique insuffisante
peut provoquer des retards.

04 Une attente trop longue
peut dégrader l'expérience.

05 L'absence de suivi
peut faire perdre des opportunités commerciales.

11.2 Concevoir l'accueil

L'accueil constitue souvent le premier contact physique avec l'organisation. Il se prépare avec soin :

- ☑ Identifier les différents types d'invités.
- ☑ Prévoir les listes et les modalités d'enregistrement.
- ☑ Former les équipes d'accueil.
- ☑ Préparer les badges si nécessaire.
- ☑ Définir la procédure pour les invités non inscrits.
- ☑ Indiquer clairement les espaces.
- ☑ Prévoir une assistance pour les besoins particuliers.

À RETENIR

La courtoisie et la clarté comptent davantage qu'un dispositif compliqué.

11.3 Réduire les points de friction

- Une signalétique compréhensible
- Des temps de circulation suffisants
- Des espaces de repos
- Une gestion claire des files d'attente
- Des sanitaires accessibles
- Des informations pratiques faciles à retrouver
- Un dispositif pour répondre aux questions
- Une procédure pour les objets perdus et les incidents

11.4 Créer une interaction réelle

Une expérience de marque ne se limite pas à regarder un écran ou à recevoir un document. Selon les objectifs, les participants peuvent tester une solution, participer à une démonstration, poser des questions, réaliser une activité, découvrir un produit, rencontrer un expert, partager une expérience ou donner un avis.


À RETENIR CHAPITRE 11

La participation reste adaptée au public : tout le monde ne souhaite pas monter sur scène ou prendre part à un jeu public.

PARTIE IV

04

ACTE 04 SUR 06

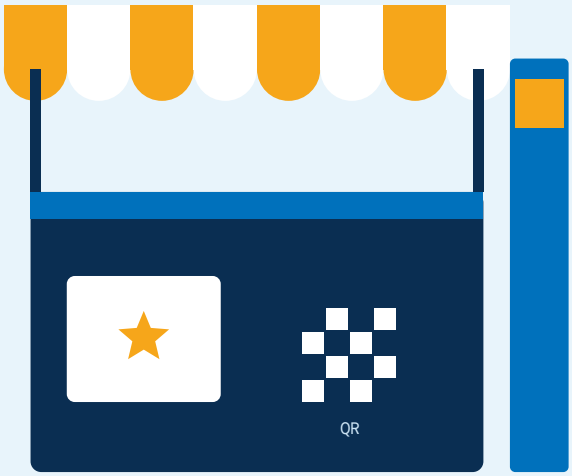

ESSAI · DÉMONSTRATION · INSCRIPTION

Activer : lancements, terrain, corporate, hybride

12 Réussir un lancement de produit ou de service
13 Concevoir une activation de marque sur le terrain
14 Organiser un événement corporate
15 Événementiel digital et formats hybrides

CHAPITRES 12 À 15 SUR 29

BILLET N°

12

ACCÈS · CH. 12/29

PARTIE IV — ACTIVER : LANCEMENTS, TERRAIN, CORPORATE, HYBRIDE

Réussir un lancement de produit ou de service

Présenter une nouveauté, expliquer sa valeur et faciliter son adoption.

Un lancement est une opération stratégique qui vise à présenter une nouveauté, à expliquer sa valeur et à faciliter son adoption.

12.1 Définir la promesse du lancement

Avant de préparer le programme, préciser :

01 Quel problème le produit résout.

02 À qui il s'adresse.

03 Quelle différence il apporte.

04 Quelles preuves soutiennent ses bénéfices.

05 Quelle action est attendue après la présentation.

PRINCIPE

La promesse doit rester crédible et vérifiable.

12.2 Construire le programme

01 Accueil et introduction

02 Contexte ou besoin

03 La nouveauté

04 Démonstration

05 Témoignage, si disponible

06 Questions et réponses

07 Essai ou découverte

08 Échanges commerciaux

09 Conclusion et suite

Le programme doit laisser suffisamment de temps pour l'expérience et les échanges.

12.3 Préparer la démonstration

Une démonstration montre les fonctions ou les bénéfices les plus pertinents pour le public. Elle se répète avant l'événement et prévoit des solutions de secours en cas de problème technique.

> ★ À SAVOIR
>
> Si une fonctionnalité n'est pas disponible ou si un résultat n'a pas été validé, il ne faut pas le présenter comme une capacité garantie.

12.4 Assurer le suivi

Après le lancement :

- [x] Remercier les participants.
- [x] Partager les informations promises.
- [x] Répondre aux questions restées ouvertes.
- [x] Qualifier les demandes reçues.
- [x] Organiser les rendez-vous nécessaires.
- [x] Documenter les retours.
- [x] Comparer les résultats aux objectifs.

★ À RETENIR

CHAPITRE 12

Le suivi commercial et relationnel fait partie du lancement. Il ne doit pas être laissé au hasard.

BILLET N°

13

ACCÈS · CH. 13/29

PARTIE IV — ACTIVER : LANCEMENTS, TERRAIN, CORPORATE, HYBRIDE

Concevoir une activation de marque sur le terrain

Aller à la rencontre du public dans un environnement réel, pour provoquer une action identifiable.

L'activation terrain permet à une marque d'aller à la rencontre de son public dans un environnement réel : points de vente, centres commerciaux, événements, espaces autorisés, campus ou lieux fréquentés par la cible.

13.1 Définir le comportement recherché

- Découvrir une marque
- Essayer un produit
- ★ Participer à une démonstration
- Demander une information
- S'inscrire
- ★ Acheter
- Recommander
- Répondre à un questionnaire

Plus le comportement recherché est précis, plus il devient facile de concevoir le dispositif et d'en mesurer les résultats.

13.2 Les principaux formats d'activation

01

Démonstration

Le public découvre le fonctionnement d'un produit ou d'un service.

02

Échantillonnage

Un échantillon est proposé lorsque le produit, le cadre réglementaire et la logistique le permettent.

03

Animation commerciale

Une équipe présente une offre et facilite l'interaction avec les visiteurs.

01
Expérience participative
Les participants réalisent une activité liée à l'univers de la marque.

02
Tournée de marque
Une équipe se déplace dans plusieurs lieux selon un calendrier défini.

03
Activation numérique sur le terrain
Un dispositif numérique, un QR code ou une interface donne accès à une information, une démonstration ou une inscription.

13.3 Concevoir le dispositif

Une activation terrain nécessite :

- Un emplacement pertinent.
- Une autorisation d'occupation, si nécessaire.
- Un objectif clair.
- Un message simple.
- Un dispositif visible et fonctionnel.
- Une équipe formée.
- Une procédure de gestion des flux.
- Un matériel adapté.
- Une collecte de données conforme.
- Des indicateurs de performance.

13.4 Former les animateurs

Les équipes terrain doivent connaître la marque, le produit ou le service, le public cible, les messages autorisés, les questions fréquentes, les limites de leur discours, les règles de comportement, les procédures d'escalade et les objectifs de l'activation.

★ À SAVOIR

Les équipes ne doivent pas inventer de promesses commerciales ni de garanties qui n'ont pas été validées.

13.5 Mesurer une activation



Taux de conversion entre les étapes et coût par interaction ou par prospect complètent la lecture.

Les méthodes de comptage se définissent avant l'opération, pour limiter les estimations imprécises.

★ À RETENIR

CHAPITRE 13

Une activation se mesure d'étape en étape, avec des méthodes de comptage décidées avant l'opération.

NOTES DE L'ORGANISATEUR

Idées, contacts, points à appliquer

BILLET N°

14

ACCÈS · CH. 14/29

PARTIE IV — ACTIVER : LANCEMENTS, TERRAIN, CORPORATE, HYBRIDE

Organiser un événement corporate

Renforcer la communication, les relations professionnelles ou la cohésion autour d'une organisation.

L'événement corporate vise à renforcer la communication, les relations professionnelles ou la cohésion autour d'une organisation : séminaire, convention, cérémonie, rencontre avec des partenaires ou journée dédiée aux collaborateurs.

14.1 Clarifier la finalité

Un événement interne peut chercher à :

- Présenter une stratégie
- Partager des résultats
- Accompagner une transformation
- Valoriser les équipes
- Développer la coopération
- Reconnaître des contributions
- Améliorer la circulation de l'information

Un événement destiné aux partenaires met plutôt l'accent sur les relations, les opportunités de collaboration et les perspectives communes.

14.2 Structurer les prises de parole

Chaque intervenant doit connaître :

01 **Son rôle**

02 **La durée prévue**

03 **Le message à transmettre**

04 **Le public**

05 **Les transitions**

06 **Les supports nécessaires**

Les prises de parole sont coordonnées pour éviter les répétitions et les contradictions.

14.3 Prévoir des formats participatifs

- Ateliers
- Groupes de travail
- Sessions de questions
- Démonstrations
- Échanges avec les dirigeants
- Retours d'expérience
- Réflexion collective

La participation sert le but de l'événement ; elle n'est pas ajoutée pour remplir le programme.

14.4 Mesurer l'utilité

Après l'événement, recueillez des retours sur la compréhension des messages, la qualité des échanges et les suites à donner.

★ À RETENIR

CHAPITRE 14

Un événement corporate est pertinent lorsqu'il facilite une action, une décision ou une relation utile à l'organisation.

BILLET N°

15

ACCÈS · CH. 15/29

PARTIE IV — ACTIVER : LANCEMENTS, TERRAIN, CORPORATE, HYBRIDE

Événementiel digital et formats hybrides

Réunir à distance ou compléter une rencontre physique, sans créer deux publics séparés.

15.1 Les événements digitaux

Webinaires, conférences virtuelles et ateliers en ligne réduisent certaines contraintes de déplacement et réunissent des personnes éloignées. Ils nécessitent toutefois une préparation technique et éditoriale.

15.2 Les événements hybrides

Un événement hybride associe des participants présents physiquement et des participants à distance. Il ne suffit pas de placer une caméra dans une salle pour créer une expérience hybride réussie. Il faut prévoir :

01 **Une captation adaptée**

02 **Un son intelligible à distance**

03 **Une plateforme de diffusion**

04 **Une connexion fiable**

05 **Une équipe technique**

06 **Un dispositif de questions**

07 **Une animation pour le public distant**

08 **Une procédure de secours**

15.3 Éviter de créer deux publics séparés

Les participants à distance doivent pouvoir suivre le programme et interagir selon les possibilités prévues. Désignez une personne responsable des questions en ligne et alternez les interventions en salle avec les contributions à distance.

15.4 Prévoir un plan de secours

Avant le direct, vérifiez les connexions, les micros, les écrans, les autorisations de diffusion et les paramètres de confidentialité. Prévoyez des solutions alternatives pour les présentations, la connexion et l'accès aux contenus.

À RETENIR

CHAPITRE 15

Un public à distance n'est pas un public secondaire : il se prépare, s'anime et s'accompagne.

NOTES DE L'ORGANISATEUR

Idées, contacts, points à appliquer

PARTIE V

05

ACTE 05 SUR 06



Communiquer et opérer

16 Communication avant, pendant et après l'événement
17 Relations presse, influence et partenariats
18 Logistique, prestataires et coordination opérationnelle
19 Accueil, protocole et expérience des invités
20 Événementiel responsable et inclusion
21 Gestion des risques et communication de crise

CHAPITRES 16 À 21 SUR 29

BILLET N°

16

ACCÈS · CH. 16/29

PARTIE V — COMMUNIQUER ET OPÉRER

Communication avant, pendant et après l'événement

La communication accompagne tout le cycle du projet, et le suivi se planifie avant le jour J.

La communication événementielle accompagne tout le cycle du projet.

AVANT — Faire venir	PENDANT — Faire vivre	APRÈS — Prolonger
Annonce initiale.	Accueil et orientation.	Message de remerciement.
Invitations personnalisées.	Couverture photographique.	Publication d'un résumé.
Page d'inscription.	Captation vidéo.	Album photo.
Publication du programme.	Publications en direct.	Vidéo récapitulative.
Présentation des intervenants.	Interviews.	Présentations autorisées.
Campagne publicitaire.	Témoignages.	Ressources promises.
Relais des partenaires.	Citations des intervenants.	Relance des prospects.
Relations presse.	Démonstrations.	Enquête de satisfaction.
Messages de rappel.	Mise en valeur des partenaires.	Bilan des résultats.
Informations pratiques.	Gestion des commentaires.	Retour d'expérience.

16.1 Avant l'événement

Les objectifs sont de faire connaître l'événement, de démontrer sa valeur et d'encourager la participation. La fréquence et le ton s'adaptent au public et à la durée de la campagne.

16.2 Pendant l'événement

Désignez une personne responsable de la communication en direct et prévoyez les validations nécessaires avant chaque publication.

16.3 Après l'événement

Le suivi doit être planifié avant l'événement. Sinon, les contacts collectés risquent de ne pas être exploités.

★ À RETENIR

CHAPITRE 16

Avant, pendant, après : trois temps, une seule histoire, et un suivi préparé dès le départ.

NOTES DE L'ORGANISATEUR

Idées, contacts, points à appliquer

BILLET N°

17

ACCÈS · CH. 17/29

PARTIE V — COMMUNIQUER ET OPÉRER

Relations presse, influence et partenariats

Des relais externes choisis pour leur pertinence, au service de la portée et de la crédibilité.

Les relais externes peuvent accroître la portée d'un événement, apporter une expertise et renforcer sa crédibilité. Ils se sélectionnent en fonction de la cible et des objectifs.

17.1 Les relations presse

Une stratégie presse peut comprendre :

- Un communiqué
- Une invitation ciblée
- Un dossier de presse
- Un programme
- Des créneaux d'interview
- Des éléments factuels vérifiés
- Un interlocuteur disponible
- Des visuels autorisés

PRINCIPE

La présence de journalistes ne garantit pas une couverture. Il faut proposer une information pertinente et faciliter leur travail, sans chercher à imposer leurs conclusions.

17.2 Les influenceurs et créateurs de contenu

Le choix d'un créateur ne repose pas uniquement sur le nombre d'abonnés. Évaluer :

- La pertinence de son audience.
- La qualité de ses interactions.
- Sa crédibilité sur le sujet.
- La cohérence avec la marque.
- La qualité de ses contenus.
- Les conditions de collaboration.
- Les droits de réutilisation.
- La transparence sur les contenus rémunérés.

Livrables, délais, messages obligatoires et limites éditoriales se définissent dans l'accord de collaboration.

17.3 Les partenariats

Un partenaire peut apporter des ressources, une audience, une expertise, un lieu ou un soutien financier. Il faut clarifier :

01 Les objectifs communs

02 Les contributions de chaque partie

03 Les contreparties

04 La visibilité accordée

05 Les droits d'utilisation des logos

06 Les responsabilités

07 Les échéances

08 Les modalités de bilan

★ À RETENIR CHAPITRE 17

Un partenariat pertinent crée une valeur identifiable pour les parties et pour le public.

BILLET N°

18

ACCÈS · CH. 18/29

PARTIE V — COMMUNIQUER ET OPÉRER

Logistique, prestataires et coordination opérationnelle

Personnes, équipements, espaces, flux, horaires et ressources : ce qui permet à l'événement de se dérouler comme prévu.

La logistique permet à l'événement de se dérouler dans les conditions prévues. Elle concerne les personnes, les équipements, les espaces, les flux, les horaires et les ressources.

18.1 Sélectionner les prestataires

- Location de salle
- Restauration
- Sonorisation
- Éclairage
- Scénographie
- Impression
- Transport
- Photographie
- Vidéo
- Accueil
- Sécurité
- Animation

Vérifiez leur expérience pertinente, leur capacité réelle, leurs références lorsqu'elles sont disponibles et leur compréhension du cahier des charges.

18.2 Formaliser les engagements

Les accords précisent les prestations, les quantités, les horaires, les tarifs, les modalités de paiement, les conditions d'annulation et les responsabilités, ainsi que les modalités de livraison, d'installation, de démontage et de gestion des problèmes.

18.3 Organiser le jour J

01 **Un responsable général**

02 **Un planning opérationnel**

03 **Un répertoire des contacts**

04 **Un plan du lieu**

01 **Une liste des prestataires**

02 **Une feuille de route des intervenants**

03 **Un protocole d'urgence**

04 **Un canal de communication interne**

À RETENIR

Un briefing avant l'ouverture permet de confirmer les rôles et les informations essentielles.

18.4 Gérer les imprévus

Retards, pannes, absences ou changements de programme peuvent survenir. L'équipe doit connaître :

01 Les décisions qu'elle peut prendre

02 Les personnes à contacter

03 Les solutions de remplacement

04 Les informations à communiquer au public

05 Les situations nécessitant une escalade

À RETENIR

CHAPITRE 18

Face à l'imprévu, la coordination privilégie la rapidité, la clarté et la sécurité.

BILLET N°

19

ACCÈS · CH. 19/29

PARTIE V — COMMUNIQUER ET OPÉRER

Accueil, protocole et expérience des invités

L'accueil influence fortement la perception d'un événement. Il se prépare autant que le programme.

Accueillir, ce n'est pas seulement enregistrer les participants. C'est leur permettre de comprendre le fonctionnement de la rencontre et de se sentir correctement orientés.

19.1 Préparer la liste des invités

- Intervenants
- Invités institutionnels
- Partenaires
- Clients
- Presse
- Équipe interne
- Prestataires

★ À SAVOIR

L'accès aux informations personnelles est limité aux personnes qui en ont besoin.

19.2 Prévoir le protocole

Lorsque des autorités, des représentants institutionnels ou des personnalités sont invités, vérifiez les usages applicables et confirmez les informations avant de finaliser le programme. Titres, fonctions, noms et ordre des prises de parole sont vérifiés, et les consignes communiquées aux équipes concernées.

19.3 Former les équipes d'accueil

- ☑ Accueillir avec courtoisie.
- ☑ Orienter les participants.
- ☑ Répondre aux questions pratiques.
- ☑ Gérer les situations difficiles.
- ☑ Contacter un responsable si nécessaire.
- ☑ Respecter la confidentialité.
- ☑ Accompagner les personnes ayant des besoins spécifiques.

19.4 Préserver la qualité de l'expérience

Une expérience positive repose souvent sur des détails bien exécutés : une information claire, un horaire respecté, un accueil fluide, une assistance disponible et des transitions maîtrisées.

★ À RETENIR

CHAPITRE 19

La qualité d'un accueil ne dépend pas du prestige du lieu ni du coût de la scénographie.

NOTES DE L'ORGANISATEUR

Idées, contacts, points à appliquer

BILLET N°

20

ACCÈS · CH. 20/29

PARTIE V — COMMUNIQUER ET OPÉRER

Événementiel responsable et inclusion

Limiter les impacts, utiliser les ressources avec discernement et ouvrir la participation au plus grand nombre.

Un événement responsable prend en compte ses impacts environnementaux, sociaux et économiques. Il limite les effets négatifs, utilise les ressources de manière réfléchie et favorise une participation aussi accessible que possible.

20.1 Réduire les déchets

- Limiter les impressions inutiles.
- Privilégier des supports réutilisables lorsque cela est pertinent.
- Prévoir une gestion des déchets.
- Éviter les objets promotionnels sans utilité.
- Estimer correctement les quantités de restauration.
- Choisir des fournisseurs capables de répondre aux exigences du projet.

20.2 Améliorer l'accessibilité

- Des accès adaptés
- Une signalétique lisible
- ★ Des informations pratiques à l'avance
- Des sous-titres pour certains contenus
- Des places adaptées
- ★ Une assistance pour les déplacements
- Une participation à distance, si pertinent

20.3 Respecter les communautés locales

Les activités terrain tiennent compte du contexte, des usages et des règles applicables. Il faut obtenir les autorisations nécessaires, informer les personnes concernées lorsque cela est approprié et éviter les dispositifs qui gênent inutilement la circulation ou les activités environnantes.

20.4 Mesurer les engagements

Une démarche responsable gagne à être concrète : volumes imprimés, déchets produits, ressources réutilisées, mesures d'accessibilité mises en place et retours des participants.

★ À RETENIR

CHAPITRE 20

Pas d'affirmation environnementale générale sans éléments vérifiables pour l'étayer.

NOTES DE L'ORGANISATEUR

Idées, contacts, points à appliquer

BILLET N°

21

ACCÈS · CH. 21/29

PARTIE V — COMMUNIQUER ET OPÉRER


Gestion des risques et communication de crise

Anticiper ce qui pourrait perturber l'événement, mettre des personnes en danger ou nuire à la réputation.

21.1 Identifier les risques

- Techniques
- Logistiques
- Financiers
- Météorologiques
- Sanitaires
- Sécurité
- Transports
- Intervenants
- Confidentialité
- Réputation
- Autorisations

21.2 Évaluer les risques

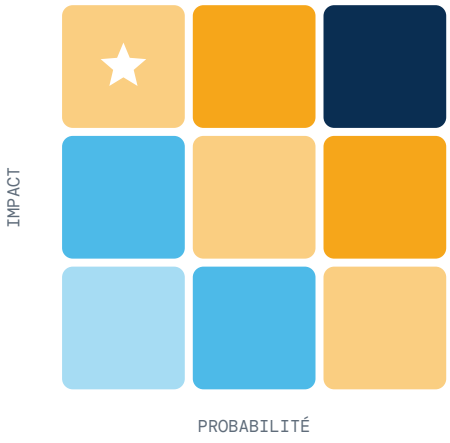

Probabilité et impact

Pour chaque risque : niveau de priorité, mesures de prévention, responsable et solution de secours.

Rare mais grave

L'étoile : un risque peu probable mais à fort impact peut exiger des mesures importantes. La priorité ne dépend pas que de la probabilité.

21.3 Préparer un plan de secours

RISQUE	MESURE PRÉVENTIVE OU SOLUTION
Panne de sonorisation	Matériel de secours et technicien disponible
Absence d'un intervenant	Intervenant remplaçant ou réorganisation du programme

RISQUE	MESURE PRÉVENTIVE OU SOLUTION
Pluie ou chaleur excessive	Solution de repli et mesures adaptées au lieu
Problème de connexion	Connexion alternative et contenus de secours
Retard d'un prestataire	Confirmation en amont et marge dans le calendrier
Affluence supérieure aux prévisions	Gestion des capacités et procédure d'accès
Incident de sécurité	Procédure d'urgence et responsables identifiés

PRINCIPE

Les réponses s'adaptent à l'événement. Les procédures de sécurité ne s'improvisent jamais le jour même.

21.4 Communiquer en cas d'incident

01 **Protéger les personnes**

02 **Vérifier les faits**

03 **Activer les responsables**

04 **Informer avec précision**

05 **Éviter les spéculations**

06 **Informer les personnes concernées**

07 **Documenter l'incident**

08 **Évaluer les mesures correctives**

★ À RETENIR


CHAPITRE 21

La sécurité et la transparence priment sur la volonté de préserver les apparences.

PARTIE VI

06

ACTE 06 SUR 06

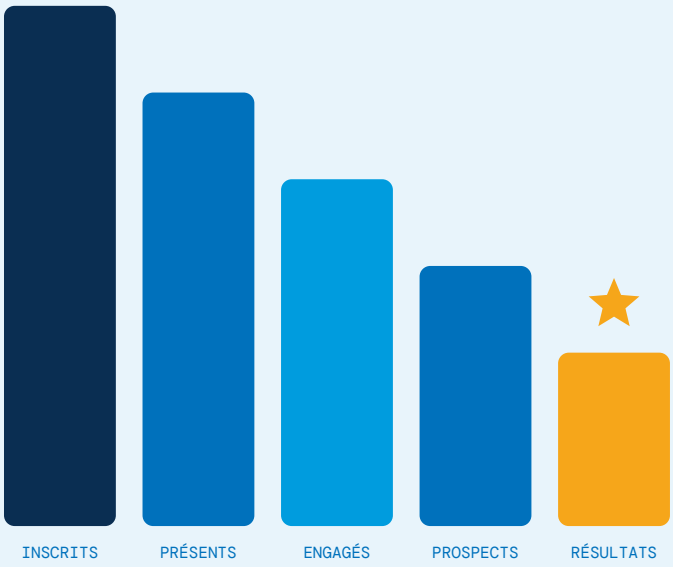

Mesurer et passer à l'action

22 Mesurer les résultats et le retour sur investissement
23 Exploiter les contenus et prolonger l'expérience
24 Intelligence artificielle et innovation événementielle
25 Les erreurs les plus fréquentes
26 La méthode SunuLink pour piloter un projet événementiel
27 Plan d'action sur 90 jours
28 Modèles, fiches pratiques et check-lists
29 Faire de chaque événement un levier d'impact

CHAPITRES 22 À 29 SUR 29

BILLET N°

22

ACCÈS · CH. 22/29

PARTIE VI — MESURER ET PASSER À L'ACTION

Mesurer les résultats et le retour sur investissement

La mesure permet de vérifier si l'événement a rempli sa fonction, au-delà de l'affluence.

Il faut distinguer les ressources mobilisées, les activités réalisées, les résultats immédiats et les effets obtenus à plus long terme.

INDICATEURS

Participation

- Inscrits.
- Participants présents.
- Taux de présence.
- Taux d'annulation.
- Répartition par catégorie.
- Participation aux activités.

INDICATEURS

Engagement

- Démonstrations.
- Questions posées.
- Participation aux ateliers.
- Interactions avec les équipes.
- Ressources consultées.
- Mentions sur les réseaux.
- Réponses aux enquêtes.

INDICATEURS

Commercial

- Prospects collectés avec une base légale appropriée.
- Prospects qualifiés.
- Rendez-vous.
- Devis demandés.
- Opportunités créées.
- Ventes attribuées et chiffre d'affaires associé.
- Coût par prospect.
- Conversion après l'événement.

INDICATEURS

Satisfaction

- L'organisation ?
- Le contenu a-t-il répondu aux attentes ?
- Quelle activité était la plus utile ?
- Que faudrait-il améliorer ?
- Être informé des prochaines éditions ?

La qualité des prospects est souvent plus utile que le simple volume de contacts. Côté satisfaction, un questionnaire court facilite les réponses.

22.1 Les formules utiles

Taux de présence = $\frac{\text{Participants présents}}{\text{Inscrits confirmés}} \times 100$

Précisez le dénominateur, notamment si les inscriptions sont ouvertes, gratuites ou sans confirmation.

Coût par participant	=	$\frac{\text{Coût total de l'événement}}{\text{Participants présents}}$	Utile pour comparer, mais insuffisant pour mesurer la valeur de l'événement.
ROI financier	=	$\frac{\text{Bénéfice attribuable – coût}}{\text{Coût de l'investissement}} \times 100$	Le chiffre d'affaires généré n'est pas le bénéfice : coûts pertinents et méthode d'attribution explicite.

Pour les événements dont les bénéfices sont surtout relationnels, institutionnels ou liés à la sensibilisation, d'autres indicateurs peuvent être plus pertinents.

22.2 Construire un bilan utile

Le rapport final précise :

01 Les objectifs initiaux
02 Les moyens mobilisés
03 Les résultats mesurés
04 Les écarts par rapport aux prévisions
05 Les incidents rencontrés
06 Les retours des participants
07 Les opportunités générées
08 Les recommandations pour la suite

★ À RETENIR — CHAPITRE 22

Un bilan utile ne cherche pas seulement à démontrer la réussite. Il identifie aussi les limites et les améliorations possibles.

BILLET N°

23

ACCÈS · CH. 23/29

PARTIE VI — MESURER ET PASSER À L'ACTION

Exploiter les contenus et prolonger l'expérience

Images, échanges et contacts continuent de créer de la valeur bien après la fin de la journée.

23.1 Préparer la captation en amont

Avant l'événement, définir :

- Les moments à photographier
- Les séquences à filmer
- Les intervenants à interviewer
- Les contenus à diffuser rapidement
- Les autorisations nécessaires
- Les formats attendus
- Les délais de livraison

La captation se planifie en fonction des usages futurs.

23.2 Décliner les contenus

01 Film récapitulatif

02 Album photo

03 Interviews

04 Citations

05 Extraits de conférence

06 Capsules pédagogiques

07 Article de bilan

08 Présentation synthétique

09 Étude de cas

10 Publications pour les réseaux

À RETENIR

Chaque contenu apporte une valeur distincte. Évitez de publier plusieurs versions qui répètent exactement le même message.

23.3 Transformer les contacts en relations

- Vérifier les informations.
- Qualifier les besoins.
- Respecter les préférences de communication.
- Envoyer les ressources promises.
- Organiser les suivis nécessaires.
- Attribuer les responsabilités commerciales.
- Documenter les suites données.

La collecte d'informations personnelles respecte les règles applicables et les engagements communiqués aux participants.

23.4 Construire une mémoire événementielle

Archiver les programmes, les budgets, les plans, les photos autorisées, les rapports et les enseignements facilite l'organisation des prochaines éditions.

★ À RETENIR CHAPITRE 23

Une mémoire événementielle permet de comparer les résultats et de ne pas répéter les mêmes erreurs.

BILLET N°

24

ACCÈS · CH. 24/29

PARTIE VI — MESURER ET PASSER À L'ACTION

Intelligence artificielle et innovation événementielle

Un appui pour concevoir, préparer et analyser, qui ne remplace ni l'accueil ni la responsabilité de l'organisateur.

L'intelligence artificielle peut contribuer à certaines tâches de conception, de préparation, de coordination et d'analyse. Elle ne remplace pas la responsabilité de l'organisateur, la qualité de l'accueil ni la nécessité de vérifier les informations.

24.1 Les usages possibles

- Explorer des concepts
- Structurer un programme
- ★ Varier les invitations
- Organiser un calendrier éditorial
- Produire une première version de documents
- ★ Classer des retours textuels
- Résumer des questionnaires
- Préparer des scripts
- ★ Adapter des contenus à plusieurs langues
- Structurer un premier bilan

24.2 Les limites à respecter

Les résultats doivent être vérifiés, notamment lorsque l'outil produit des informations sur des personnes, des horaires, des lieux, des réglementations ou des chiffres.

★ À SAVOIR

Données confidentielles, listes d'invités et informations commerciales ne s'envoient pas à un outil sans avoir vérifié les règles de confidentialité et les autorisations applicables.

24.3 Les innovations expérientielles

Selon le budget et la pertinence, un événement peut intégrer :

01 **Démonstrations interactives**

02 **QR codes**

03 **Réalité augmentée**

04 **Interfaces numériques**

05 **Parcours personnalisés**

06 **Vote ou questions en direct**

07 **Présentations interactives**

★ À RETENIR — CHAPITRE 24

La technologie doit résoudre un problème ou améliorer une expérience, pas être ajoutée parce qu'elle est nouvelle.

NOTES DE L'ORGANISATEUR — *Idées, contacts, points à appliquer*

BILLET N°

25

ACCÈS · CH. 25/29

PARTIE VI — MESURER ET PASSER À L'ACTION

Les erreurs les plus fréquentes

Dix erreurs observées fréquemment, leur conséquence et la solution qui permet de les éviter.

01 Organiser sans objectif clair

Difficulté à prendre des décisions et à mesurer les résultats.

Définir les objectifs, les publics et les indicateurs dès le début.

02 Privilégier le décor au contenu

Une expérience visuellement impressionnante, mais peu utile.

Équilibrer scénographie, programme, interactions et valeur apportée.

03 Sous-estimer les délais

Décisions précipitées, coûts supplémentaires et risques opérationnels.

Établir un rétroplanning et intégrer des marges réalistes.

04 Mal choisir le lieu

Difficultés d'accès, problèmes techniques ou inconfort.

Vérifier la capacité réelle, les installations et le parcours des participants.

05 Négliger la communication en amont

Faible participation ou public mal informé.

Prévoir une campagne adaptée au public et au cycle d'inscription.

06 Collecter des contacts sans suivi

Perte d'opportunités commerciales et relationnelles.

Préparer règles de collecte, qualification et suivi avant l'événement.

07 Oublier le plan de secours

Une panne ou une absence peut désorganiser tout le programme.

Identifier les risques prioritaires et prévoir des solutions réalistes.

08 Négliger les participants à distance

Une expérience hybride déséquilibrée.

Prévoir animation, assistance et dispositif technique pour le public distant.

09 Mesurer uniquement l'affluence

Une vision incomplète de la performance.

Mesurer aussi engagement, satisfaction, prospects et résultats commerciaux.

10 Ne pas formaliser les enseignements

Les mêmes erreurs se répètent.

Organiser un bilan et archiver les documents utiles après chaque événement.

★ À RETENIR

CHAPITRE 25

Ces erreurs se préviennent pendant la préparation, rarement le jour J.

BILLET N°

26

ACCÈS · CH. 26/29

PARTIE VI — MESURER ET PASSER À L'ACTION

La méthode SunuLink pour piloter un projet événementiel

Six phases pour traiter l'événement comme un projet complet, de la première intention aux résultats.

Pour garantir la cohérence entre la stratégie, la création, l'exécution et la mesure, SunuLink Consulting structure son approche en six phases.

01 Diagnostiquer · 02 Stratégiser · 03 Concevoir · 04 Organiser · 05 Activer · 06 Mesurer

01 Diagnostiquer

Comprendre le besoin, les publics, le contexte, les contraintes et les objectifs.

Résultat attendu : un cadre clair pour décider.

// QUESTIONS CLÉS

- [ ] Note de cadrage.
- [ ] Analyse des publics.
- [ ] Objectifs et indicateurs.

02 Concevoir la stratégie

Définir le positionnement événementiel, le format, les messages, le parcours et la stratégie de communication.

Résultat attendu : une direction partagée.

// QUESTIONS CLÉS

- [ ] Recommandation stratégique.
- [ ] Concept.
- [ ] Architecture de messages.
- [ ] Plan de communication.

03 Créer l'expérience

Développer la direction artistique, la scénographie, les supports, les activités et les éléments d'activation.

Résultat attendu : une expérience conçue dans le détail.

// QUESTIONS CLÉS

- [ ] Identité événementielle.
- [ ] Plan d'implantation.
- [ ] Maquettes.
- [ ] Déroulé.

04 Organiser et coordonner

Piloter les prestataires, le budget, le calendrier, les équipes, les autorisations et les risques.

Résultat attendu : une organisation maîtrisée.

// QUESTIONS CLÉS

- [ ] Rétroplanning.
- [ ] Budget consolidé.
- [ ] Plan logistique.
- [ ] Fiches de responsabilités.
- [ ] Plan de secours.

05 Exécuter et communiquer

Coordonner l'événement, gérer l'accueil, superviser les prestataires et assurer la communication.

Résultat attendu : un jour J sous contrôle.

// QUESTIONS CLÉS

- [ ] Feuille de route du jour J.
- [ ] Contenus de couverture.
- [ ] Suivi opérationnel.

06 Mesurer et optimiser

Analyser les résultats, organiser le suivi des contacts et formuler des recommandations.

Résultat attendu : des enseignements pour la prochaine édition.

// QUESTIONS CLÉS

- [ ] Rapport final.
- [ ] Tableau de bord.
- [ ] Bilan budgétaire.
- [ ] Plan d'amélioration.

★ À RETENIR CHAPITRE 26

Cette méthode traite l'événement comme un projet complet, de la première intention aux résultats obtenus.

BILLET N°

27


ACCÈS · CH. 27/29

PARTIE VI — MESURER ET PASSER À L'ACTION

Plan d'action sur 90 jours

Trois mois pour structurer progressivement un dispositif événementiel.

Ce plan aide une entreprise à structurer progressivement son dispositif événementiel.

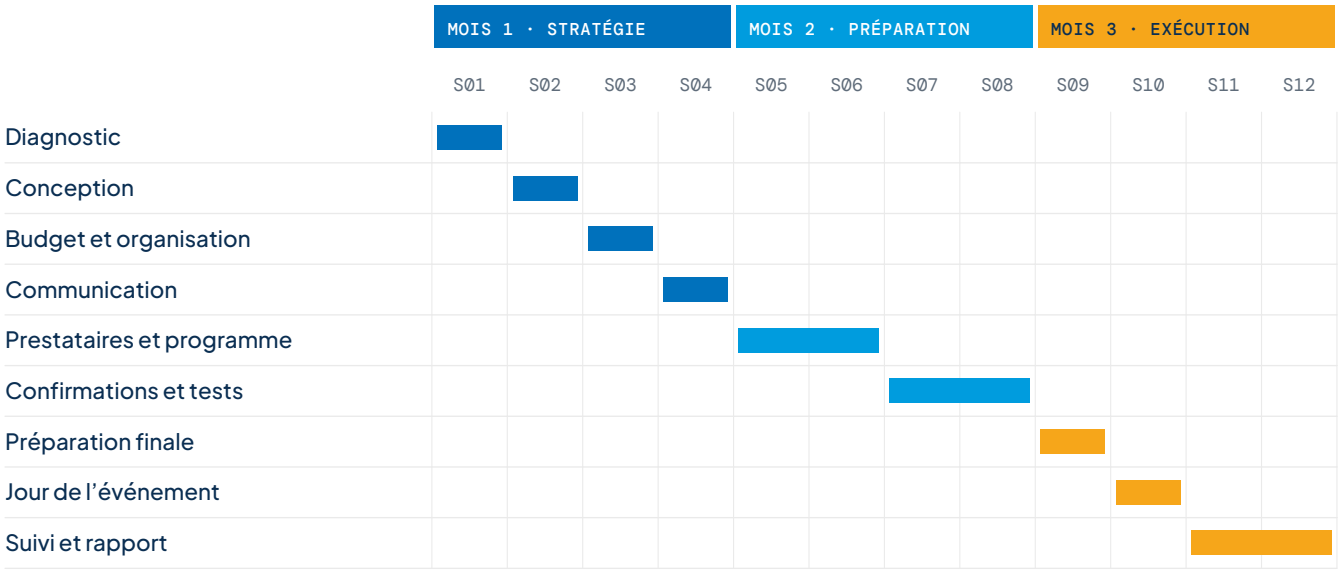

Mois 1 — Préparer la stratégie

S01 Diagnostic

- Clarifier les objectifs.
- Identifier les publics.
- Analyser les événements antérieurs.
- Examiner les moyens disponibles.

Livrable : objectifs et publics clarifiés.

S02 Conception

- Définir le concept.
- Choisir le format.
- Identifier les partenaires potentiels.
- Évaluer les lieux et les contraintes.

Livrable : concept et format retenus.

S03 Budget et organisation

- Établir un budget prévisionnel.
- Identifier les prestataires.
- Définir les responsabilités.
- Construire le rétroplanning.

Livrable : budget et rétroplanning.

S04 Communication

- Préparer l'identité événementielle.
- Rédiger les invitations.
- Définir les canaux de diffusion.
- Préparer le dispositif d'inscription.

Livrable : plan de communication prêt.

Mois 2 — Déployer et préparer l'expérience

S05 Semaines 5 et 6

- Confirmer les prestataires.
- Finaliser le programme.
- Lancer les invitations.
- Préparer les supports.
- Organiser les premiers tests.

Livrable : programme finalisé, invitations lancées.

S07 Semaines 7 et 8

- Confirmer les participants.
- Vérifier les besoins logistiques.
- Former les équipes.
- Préparer les messages et les contenus.
- Tester les dispositifs techniques.

Livrable : équipes formées, dispositifs testés.

Mois 3 — Exécuter et mesurer

S09 Semaine 9

- Finaliser les confirmations.
- Réaliser le briefing général.
- Vérifier les procédures de sécurité.
- Contrôler les livrables.

Livrable : feu vert opérationnel.

S10 Semaine 10

- Réaliser l'événement.
- Coordonner les équipes.
- Documenter les interactions.
- Collecter les données prévues.

Livrable : événement réalisé et documenté.

S11 **Semaines 11 et 12**

- Remercier les participants.
- Assurer le suivi des contacts.
- Analyser les résultats.
- Comparer les coûts aux prévisions.
- Produire un rapport et préparer les améliorations.

Livrable : rapport final et plan d'amélioration.

★ RÉSULTAT ATTENDU

CHAPITRE 27

À la fin du cycle : une vision claire des résultats, des coûts, de la satisfaction, des opportunités créées et des actions à améliorer.

NOTES DE L'ORGANISATEUR

Idées, contacts, points à appliquer

BILLET N°

28

ACCÈS · CH. 28/29

PARTIE VI — MESURER ET PASSER À L'ACTION

Modèles, fiches pratiques et check-lists

Huit outils prêts à l'emploi pour cadrer, budgéter, contrôler et évaluer.

Huit fiches à imprimer, à remplir ou à adapter à vos projets.

// FICHE 01

Brief événementiel

Nom du projet	Concept ou idée centrale
Organisation	Format
Contexte	Date et lieu envisagés
Objectif principal	Budget prévisionnel
Objectifs secondaires	Messages principaux
Public cible	Indicateurs de réussite
Nombre de participants visé	Responsable du projet

Fiche 02 — Modèle de budget

POSTE	BUDGET PRÉVISIONNEL	DEVIS CONFIRMÉ	COÛT RÉEL	ÉCART
Location				
Scénographie				
Technique				

POSTE	BUDGET PRÉVISIONNEL	DEVIS CONFIRMÉ	COÛT RÉEL	ÉCART
Communication				
Restauration				
Équipe				
Transport				
Audiovisuel				
Activation				
Réserve				
Total				

Les montants se renseignent avec les taxes, frais et conditions applicables clairement identifiés.

Fiche 03 — Check-list avant l'événement

CADRAGE ET PROGRAMME

- ☐ Les objectifs sont validés.
- ☐ Le budget est approuvé.
- ☐ Le lieu est confirmé.
- ☐ Les autorisations nécessaires sont obtenues.
- ☐ Le programme est validé.
- ☐ Les intervenants sont confirmés.
- ☐ Les prestataires ont reçu leurs consignes.
- ☐ Les invitations ont été envoyées.
- ☐ Les inscriptions sont suivies.

OPÉRATIONS ET SUIVI

- ☐ Les supports de communication sont prêts.
- ☐ La signalétique est préparée.
- ☐ Les besoins techniques sont vérifiés.
- ☐ Les équipes sont formées.
- ☐ Le plan de secours est disponible.
- ☐ Les mesures de sécurité sont définies.
- ☐ La collecte des données est conforme.
- ☐ Le dispositif de mesure est prêt.
- ☐ Le plan de suivi post-événement est défini.

Fiche 04 — Déroulé opérationnel du jour J

HEURE	SÉQUENCE	RESPONSABLE	RESSOURCES	POINT DE VIGILANCE
	Installation			
	Test technique			
	Briefing équipe			
	Accueil			
	Ouverture			
	Programme principal			
	Pause ou activation			
	Conclusion			
	Départ des invités			
	Démontage			

Fiche 05 — Suivi des inscriptions

PARTICIPANT OU ORGANISATION	CATÉGORIE	INVITATION	CONFIRMATION	PRÉSENCE	SUIVI

Les données personnelles se conservent de manière sécurisée et s'utilisent conformément aux règles applicables et aux informations communiquées aux personnes.

// FICHE 06

Bilan post-événement

Nom de l'événement	Satisfaction des participants
Objectifs initiaux	Opportunités commerciales ou relationnelles
Nombre d'inscrits	Incidents ou difficultés
Participants présents	Points forts
Budget prévisionnel	Axes d'amélioration
Coût réel	Actions à entreprendre
Principaux résultats	Validé par

Fiche 07 — Évaluer une activation terrain

01 Le public rencontré correspondait-il à la cible ?

02 Le dispositif était-il visible et compréhensible ?

03 Combien de personnes ont été approchées ?

04 Combien ont réellement interagi avec la marque ?

05 Combien ont essayé le produit ou demandé une information ?

06 Combien de contacts qualifiés ont été obtenus ?

07 Quels commentaires sont revenus le plus souvent ?

08 Quels problèmes opérationnels ont été rencontrés ?

09 Quel a été le coût par interaction ou par prospect ?

10 Quelles améliorations pour la prochaine activation ?

Fiche 08 — Grille d'évaluation d'un événement

Notez chaque critère de 1 à 5.

	CRITÈRE	1	2	3	4	5	NOTE
01	Clarté des objectifs	☐	☐	☐	☐	☐	/5
02	Pertinence du concept	☐	☐	☐	☐	☐	/5
03	Adaptation au public	☐	☐	☐	☐	☐	/5
04	Qualité du programme	☐	☐	☐	☐	☐	/5
05	Organisation logistique	☐	☐	☐	☐	☐	/5
06	Qualité de l'accueil	☐	☐	☐	☐	☐	/5
07	Cohérence de l'identité visuelle	☐	☐	☐	☐	☐	/5
08	Efficacité de la communication	☐	☐	☐	☐	☐	/5
09	Gestion des risques	☐	☐	☐	☐	☐	/5
10	Qualité du suivi après l'événement	☐	☐	☐	☐	☐	/5

★ À RETENIR

CHAPITRE 28

Cette grille est un outil de diagnostic. Elle se complète par les résultats mesurés et les retours des participants.

BILLET N°

29

ACCÈS · CH. 29/29

PARTIE VI — MESURER ET PASSER À L'ACTION

Faire de chaque événement un levier d'impact

Un événement doit créer une rencontre utile, transmettre un message clair et contribuer à un résultat identifiable.

L'événementiel et l'activation de marque offrent aux entreprises un moyen puissant de transformer leur communication en expérience. Ils réunissent des publics, présentent des solutions, valorisent des expertises et créent des interactions qui prolongent la relation entre une marque et ses audiences.

> **Un événement réussi ne se résume ni au nombre de participants, ni à la qualité du décor, ni à la visibilité des logos.**

Sa véritable valeur réside dans la cohérence entre l'objectif, le public, le concept, l'organisation et les résultats.

FORMAT	CE QU'IL DOIT ACCOMPLIR
Un lancement	Aider le public à comprendre une nouveauté
Une activation	Provoquer une interaction pertinente
Une conférence	Apporter des connaissances ou faciliter des échanges utiles
Une rencontre corporate	Servir les objectifs de l'organisation

Cette exigence implique de préparer chaque étape, de gérer les ressources avec rigueur, d'anticiper les risques et de mesurer ce qui a réellement été accompli.

Dans les marchés africains, l'événementiel peut également jouer un rôle important dans la proximité avec les communautés, la découverte des offres et le développement des relations professionnelles. Pour réussir, les dispositifs doivent être conçus à partir des réalités locales, des besoins du public et des contraintes concrètes du terrain.

La technologie et la créativité enrichissent l'expérience, à condition de servir une intention claire. La méthode reste essentielle : diagnostiquer, concevoir, organiser, activer, mesurer et améliorer.

★ À RETENIR

CHAPITRE 29

Un événement ne doit pas seulement occuper une date dans un calendrier. Il doit créer une rencontre utile, transmettre un message clair et contribuer à un résultat identifiable.

NOTES DE L'ORGANISATEUR

Idées, contacts, points à appliquer

À PROPOS

SunuLink Consulting

SunuLink Consulting est un cabinet de conseil stratégique et une agence de communication 360° qui accompagne les organisations dans la structuration de leur stratégie, le développement de leur visibilité, la valorisation de leur marque et la conception de dispositifs de communication adaptés à leurs objectifs.

Ses expertises couvrent notamment :

01 Conseil stratégique

02 Branding

03 Communication digitale

04 Création de contenus

05 Production audiovisuelle

06 Événementiel

07 Activation de marque

08 Développement commercial

09 Intelligence artificielle et automatisation

NOUS RETROUVER

Ressources & Expertises — Guide pratique Événementiel & Activation de marque

Site web : www.sunulink.sn · E-mail : contact@sunulink.sn. Retrouvez SunuLink Consulting sur LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube.

NOTRE SIGNATURE

SunuLink Consulting, le lien qui transforme vos ambitions en impact.

SunuLink CONSULTING

Cabinet de conseil stratégique & agence de communication 360°

Le lien qui transforme vos ambitions en impact.

NOS EXPERTISES

- Stratégie & Conseil
- Marketing Digital & SEO
- Développement Commercial & Partenariats
- Événementiel & Activation
- Branding & Identité Visuelle
- Création de Contenus & Visuels
- IA & Automatisation
- SunuLink Prod — Audiovisuel & Production

+221 71 008 59 15 · +221 76 973 00 00

contact@sunulink.sn

www.sunulink.sn

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

ÉDITION 2026-2027
